SquadHQ

Implementierung & Feedback

P4 | Software-Projekt WS 2026/27 | Hochschule Flensburg | 11.11.2026

Alle 6 MVPs laufen: vom Training über die Strafe bis zur bezahlten Teamkasse, lückenlos protokolliert.

Heute

1. Geplant vs. erreicht
2. Prototyp: P3 → heute
3. Architektur & Coding-Standards
4. Board, Commits & Feedback
5. Tests & nächste Schritte

Abbas Sharba
Requirements

Kevin Wolfram
Architektur & Entwurf

Jegor Geer
Implementierung

Ömer-Faruk Simsek
QA/Testing

Kirill Korsun
Management

Sprint 2: geplant vs. erreicht

Geplant (aus P3)

- Kassenwart-Ansicht, Zahlungen bar, PayPal, Teilzahlung
- Trainings anlegen, Fehlzeiten-Übersicht
- Echter Login statt nur Demo-Anmeldung
- Coding-Standards, CI, E2E-Tests
- Feedback-Runde beim TSV Kronshagen

Erreicht

- Alle 6 MVPs lauffähig, live auf Vercel
- Kassenwart-Ansicht: offen, bezahlt, überfällig
- Zahlungen mit 1 Klick, auch Teilzahlung
- Protokoll: Strafen, Zahlungen, Anwesenheit
- Registrierung mit E-Mail und Passwort
- Coding-Standards + CI, 62 Tests grün
- Feedback-Runde: App dem Team gezeigt

Offen / verschoben

- Fehlzeiten-Übersicht je Spieler
- E2E-Tests im Browser automatisiert (P5)
- Demo-Anmeldung abschalten, Team-Code, Rollenvergabe (vor Nutzertest)
- Mahngebühr automatisch buchen (#52)

6 / 6 MVPs umgesetzt


62 Tests bestanden

12 / 12 Akzeptanzschritte


Live squadhq-omega.vercel.app

Prototyp: P3 → heute

P3 (04.11.): Kernablauf




Spieler sagt ab




Trainer gibt frei


Heute: alle 6 MVPs



Registrieren



Training anlegen



Teamkasse



Protokoll

Neu: Konto mit E-Mail · Trainer legt Trainings an · Kassenwart verbucht bar/PayPal/Teilzahlung · Überfällige markiert · Protokoll nicht änderbar · Lade-/Gespeichert-Anzeige an allen Buttons

Live-Demo

Code folgt dem Entwurf: Schichten = Ordner

	Entwurf (Komponentendiagramm)	Code (src/…)
1	**Präsentation** Spieler-Ansicht, Trainer-Dashboard, Kassenwart-, Protokoll-Ansicht, Einloggen & Registrieren	`app/**/page.tsx  (5 Bereiche)`
2	**Anwendung** Eingaben verarbeiten, Einloggen & Rollenprüfung, Registrierung	`app/actions.ts, lib/auth.ts, lib/registration.ts`
3	**Services** Zu-/Absagen & Anwesenheit, Strafen vorschlagen & freigeben, Zahlungen verbuchen, Protokollierung	`services/  (4 Dateien, 1 je Kasten)`
4	**Fachlogik** Regelverwaltung (Strafregeln, Saldo, Fristen)	`domain/penalties.ts`
5	**Datenzugriff** Datenbankzugriff → PostgreSQL (Supabase)	`lib/db.ts, prisma/schema.prisma`

Abhängigkeiten nur nach unten, automatisch geprüft: Greift eine Seite direkt auf die Datenbank oder die Fachlogik zu, meldet ESLint einen Fehler und die CI wird rot. Gleiche Namen in Diagrammen und Code: docs/architektur/namensliste.md

Coding-Standards: vereinbart, begründet, geprüft

Formatierung

Prettier: 2 Leerzeichen, max. 120 Zeichen, kein Streit über Stil

Codequalität

ESLint (Next.js + TypeScript), strict, kein any

Schichten

Seite → Action → Service → Fachlogik / DB, als Regel geprüft

Benennung

Code Englisch, App-Texte Deutsch, Namensliste, Geld in Cent

Tests

Jede Fachregel mit Unit-Test, jeder MVP-Ablauf mit DB-Test

Commits

Deutsch, „was + wozu“, Issue-Nummer, Feature-Branch + PR

So wird geprüft

1. **Editor**
   formatiert beim Speichern
2. **npm run check**
   Lint, Format, Typen, Tests
3. **GitHub Actions**
   bei jedem Push: alles + 62 Tests + Build
4. **Review**
   zweite Person per Pull Request, ab 12.11.

Regeln mit Begründung: docs/coding-guidelines.md

Board & Commits


Board nach Entwicklungsphasen

- Backlog
- Anforderungen
- Entwurf
- **Implementierung**
- Test
- Nutzertest
- Fertig

- Spalten = Phasen (Feedback aus P3)
- Je MVP ein Issue (#21, #22, #24, #25, #44, #28)
- Sprint „Features & Design“: Issues #45–#53

live zeigen github.com/users/Kirillv2/projects/1

Commits auf main



Seit P3: 15 Commits, alle mit KI-Unterstützung (Claude Code) erstellt. Auftrag, Abnahme und Deployment: Kirill. Kirills 10 Commits enthalten 5 Merges von Pull Requests.

live zeigen Repo → Insights → Contributors

Ab Sprint „Features & Design“: jedes Feature auf eigenem Branch mit Pull Request und Review

Kundenfeedback: TSV Kronshagen 1. Herren

Wer	Ergebnis (Interview / Katalog)	Konsequenz in der App	Stand P4
Trainer	*Fehltermin erst bestätigen, bevor eine Strafe gebucht wird*	Strafvorschlag wartet auf Freigabe	**fertig**
Trainer	*Sieht in WhatsApp nicht, wer kommt*	Trainer-Dashboard mit Rückmeldefrist	**fertig**
Kassenwart	*Nachvollziehen, wer was eingetragen oder storniert hat*	Protokoll, nicht änderbar	**fertig**
Kassenwart	*Bar, PayPal, Teilzahlung*	1-Klick-Verbuchen, Teilzahlung	**neu in P4**
Spieler	*Absagen fällt schwer*	1 Klick, Grund optional	**fertig**
Strafenkatalog	*20 € unentschuldigt, Frist, 5 € je Woche Verzug*	Katalog als Daten, Frist 7 Tage, Überfällige markiert	**teilweise**

Neu seit P3: Feedback am Prototyp

Wer: Spieler, Trainer und Kassenwart


Wie: Live-App (Vercel) gezeigt, nach P3

Ergebnis: Spieler: gut, übersichtlich. Trainer: sieht, wer wie absagt. Kassenwart: Bezahlung gut

Konsequenz: Kernablauf bleibt; messbares Feedback im Nutzertest 02.12. (Aufgaben, SUS)

Teststand: 62 Tests grün, 1 Defekt dokumentiert

Automatisierte Tests je Bereich (Vitest)

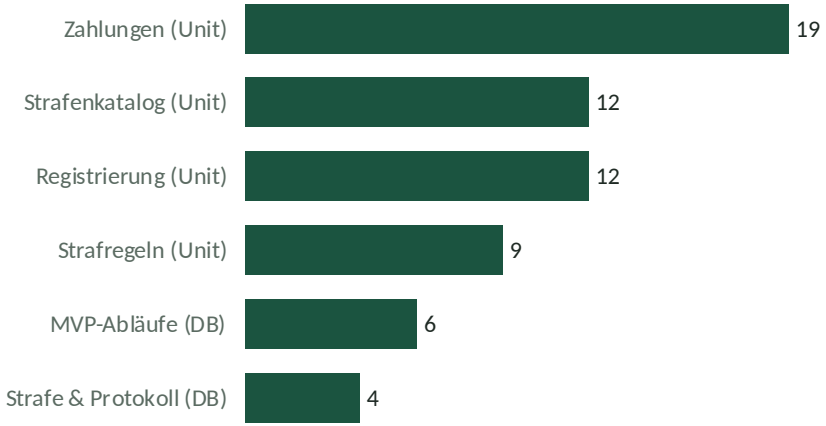

52 Unit-Tests · 10 Komponententests mit Testdatenbank · alle bestanden

Akzeptanztest

Demo-Ablauf mit 12 Prüfschritten im Browser: 12 bestanden (10.11., Produktions-Build)

CI (GitHub Actions)

Lint, Format, Typen, alle 62 Tests mit Datenbank, Build: grün

Defekt D-01 (gering, offen)

- DB-Tests laufen parallel: 1 von 27 Läufen rot
- Betrifft nur Tests, nicht die App
- Umgehung: Tests nacheinander, Behebung zu P5

Ergebnisse und Defekte: docs/testing/akzeptanzkriterien.md

Nächste Schritte bis zum Nutzertest

1 12.–25.11. — 2 bis 02.12. — 3 25.11. · P5 — 4 02.12.

Sprint „Features & Design“

- Handy-Design (#45)
- Strafen aus dem Katalog manuell (#46)
- Spiele als Termin (#47)
- Mahngebühr automatisch (#52)
- Einnahmen & Ausgaben (#53)

Echte Anmeldung

- Demo-Anmeldung abschalten
- Anmeldung fälschungssicher (signiertes Cookie)
- Team-Code zum Beitreten
- Trainer vergibt Rollen (#20)

Qualität & Tests

- E2E-Tests im Browser
- Defekt D-01 beheben
- Reviews per Pull Request
- Fehlzeiten-Übersicht

Nutzertest

- Reale Personen vom TSV Kronshagen
- Aufgaben mit Zeitmessung
- SUS-Fragebogen
- Ergebnisse zu P6 (09.12.)

Offene Fragen

1

Nutzertest 02.12.

Wie viele Testpersonen erwarten Sie, und reicht es, wenn sie die Live-App mit vorbereiteten Testdaten nutzen?

2

Tests zu P5

Zählen unsere Tests der Services gegen eine Testdatenbank als Komponententests, oder erwarten Sie zusätzlich Tests der Oberfläche?

3

KI-Unterstützung

Wie sollen wir mit KI erstellten Code in Commits und Dokumentation kennzeichnen?

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
